PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

REGIONE MARCHE

Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica

INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE LIGNEE DI COPERTURA AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL'IMMOBILE SEDE DEL CONSERVATORIO G. B. PERGOLESI

via dell'Università, 16 - Fermo

CUP C69E19001610003

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 300.000

GRUPPO DI LAVORO:
Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani
Ing. Alessandra Agostini
Ing. Lucia Evandri
Ing. Benedetta Marcozzi
Ing. Jonata Sabbioni

PROGETTISTA STRUTTURE:
GEA SOC. COOP.
PREVENZIONE RISCHIO SISMICO
GRUPPO DI LAVORO:
Ing. Alessandro Bianchi
Ing. Roberto Giacchetti
Ing. Alessia Montucchiari

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

ELABORATO:

Cronoprogramma

A - 03

SCALA:

NOME FILE:
nas\ufficio-sismica_ISTITUTI SCOLASTICI\FERMO CONSERVATORIO PERGOLESI\MESSA IN SICUREZZA TETTO 2019\PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO\B - ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI\06_CRONOPROGRAMMA

DATA:
febbraio 2020

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Nr	Nome fase/Descrizione	Durata (giorni)
1	**Diagramma di Gant**	**165/165**
2	**Allestimento cantiere e opere provvisionali**	**21/165**
2.1	Delimitazione del cantiere. Predisposizione e allestimento delle diverse aree di cantiere (stoccaggio, movimentazione, sedime gru, etc).	2
2.2	Allestimento gru fissa e semovente.	2
2.3	Allestimento ponteggi e schermature.	7
2.4	Puntellature e opere provvisionali.	2
2.5	Altre opere provvisionali (linee vita per lavori in quota, parapetti di sicurezza, etc).	2
2.6	Spostamento mobilio	2
3	**Opere impiantistiche - illuminazione di emergenza**	**2/165**
3.1	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	1
3.2	Impianto elettrico di cantiere. Allacci varie di cantiere.	1
4	**Demolizioni, rimozioni e smaltimenti**	**38/165**
4.1	Demolizione e rimozione cartongesso. Trasporto in discarica e smaltimento.	3
4.2	Smontaggio e stoccaggio manto di copertura e lattoneria.	3
4.3	Smontaggio e rimozione strutture secondarie copertura. Trasporto in discarica e smaltimento.	3
4.4	discarica.	12
4.5	Smontaggio e rimozione muratura (setto centrale). Trasporto in discarica e smaltimento.	3

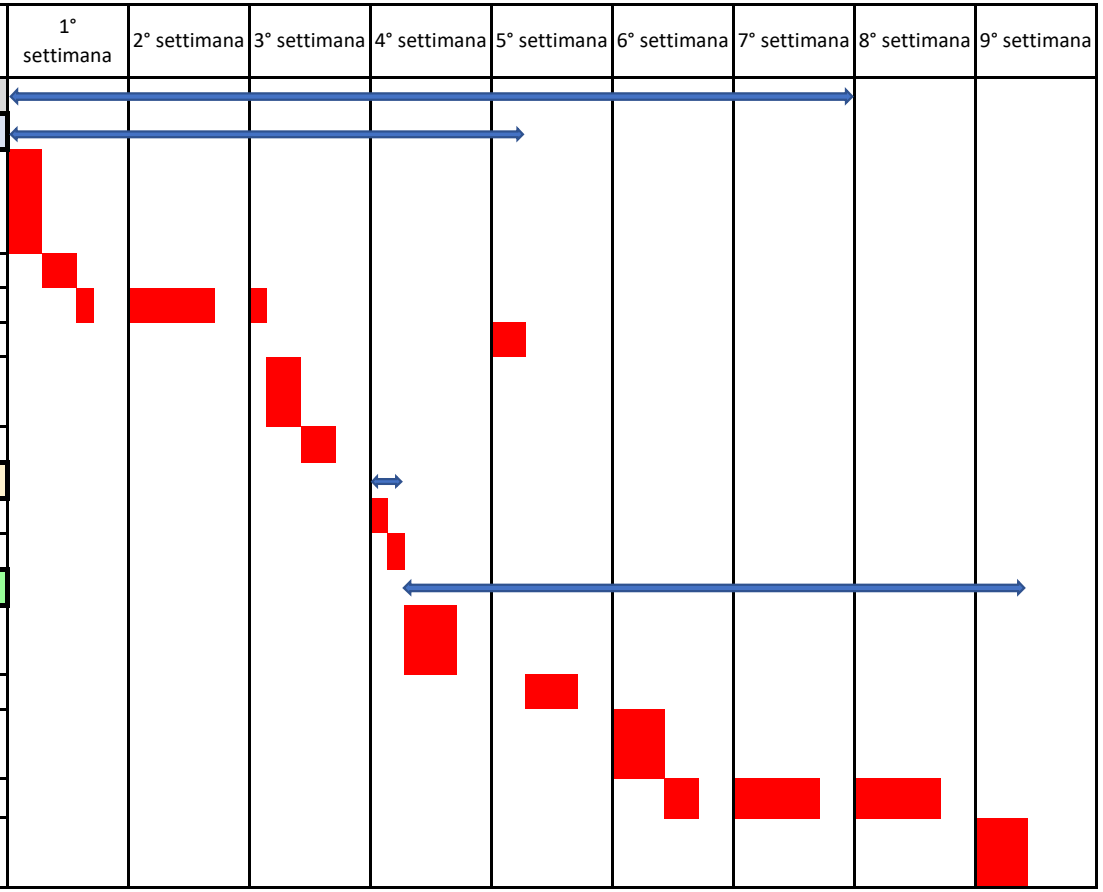

Nr	Nome fase/Descrizione	Durata
1	**Diagramma di Gant**	**165/165**
5	**Nuove strutture e opere connesse**	**66/165**
5.1	Realizzazione delle opere in c.a. (cordoli, etc)	28
5.2	Installazione nuove capriate metalliche.	14
5.3	Realizzazione controventamenti e cerchiature metalliche.	4
5.4	Installazione degli altri manufatti in acciaio (passerella, etc).	3

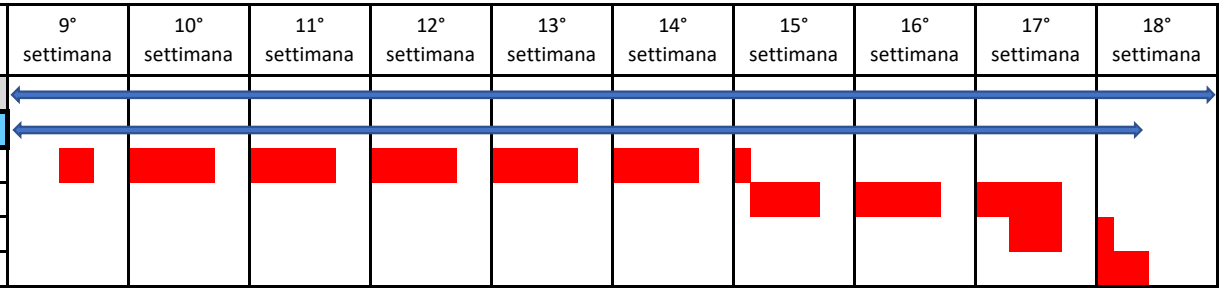
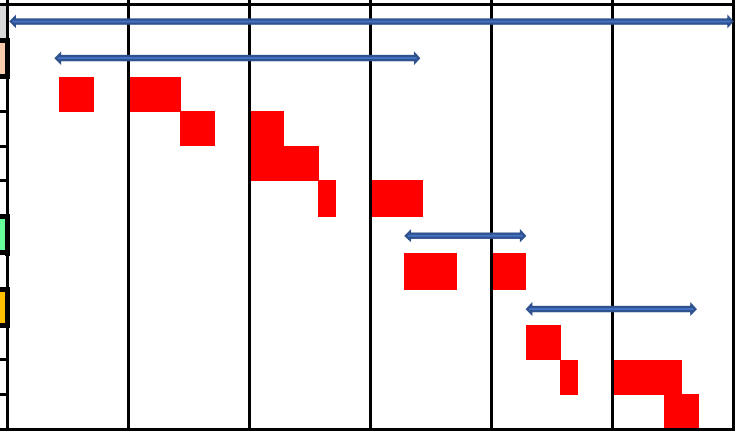
Nr	Nome fase/Descrizione	Durata	18° settimana	19° settimana	20° settimana	21° settimana	22° settimana	23° settimana
1	**Diagramma di Gant**	**165/165**						
6	**Finiture e altre opere di completamento**	**21/165**						
6.1	Installazione delle pannellature di copertura e della finestra a tet	5						
6.2	Posa del manto di copertura e delle lattonerie.	4						
6.3	Installazione delle controsofittature.	4						
6.4	Tinteggiature interne di controsoffittature e pareti.	4						
7	**Impianti**	**7/165**						
7.1	Realizzazione nuovo impianto elettrico piano sottotetto	5						
8	**Smobilizzo Cantiere**	**10/165**						
8.1	Ripristini post cantierizzazione (rimozioni puntellature e protezio	2						
8.2	Ripristino impianti e mobilio	5						
8.3	Rimozione delimitazione area cantiere e pulizia delle aree	2
